



Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/09/2023 **Inspecteur:** Pieterjan Hombrouckx **Mentor:** **Installateur:** AB Group bv
ID-label: ZD3 **B.T.W. nr.:** BE 0534 837 214 **Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 **Serienummer:** 21251309

Datum verslag: 27/09/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Du Roy de Blicquy laan
Huisnummer: 5
Busnummer: W
Postcode: 1933
Gemeente: Zaventem
Land: België

Eigenaar

Naam: -
Straatnaam: Du Roy de Blicquy laan
Huisnummer: 5
Busnummer: W
Postcode: 1933
Gemeente: Zaventem
Land: België

Installateur

Naam: AB Group bv
BTW nr.: BE 0534 837 214
Telefoonnummer: +32 489 77 34 44
E-mail: andy@abgroupbv.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: :-

Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4, en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Ja

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 21

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 15.18 MΩ

RE: 2.87 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	NVT	NVT
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	32	Kelder	2	6
1	C	20	Kelder	2	2,5
Bord appartement	-	-	-	-	-
1	C	32		2	6
4	C	16		2	1,5
14	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 37 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.
- nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 15/9/2048
 - De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 - Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6,5,8, van Boek 1. Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Pieterjan Hombrouckx



Pieterjan Hombrouckx
ACEG VZW - #290

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/9/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



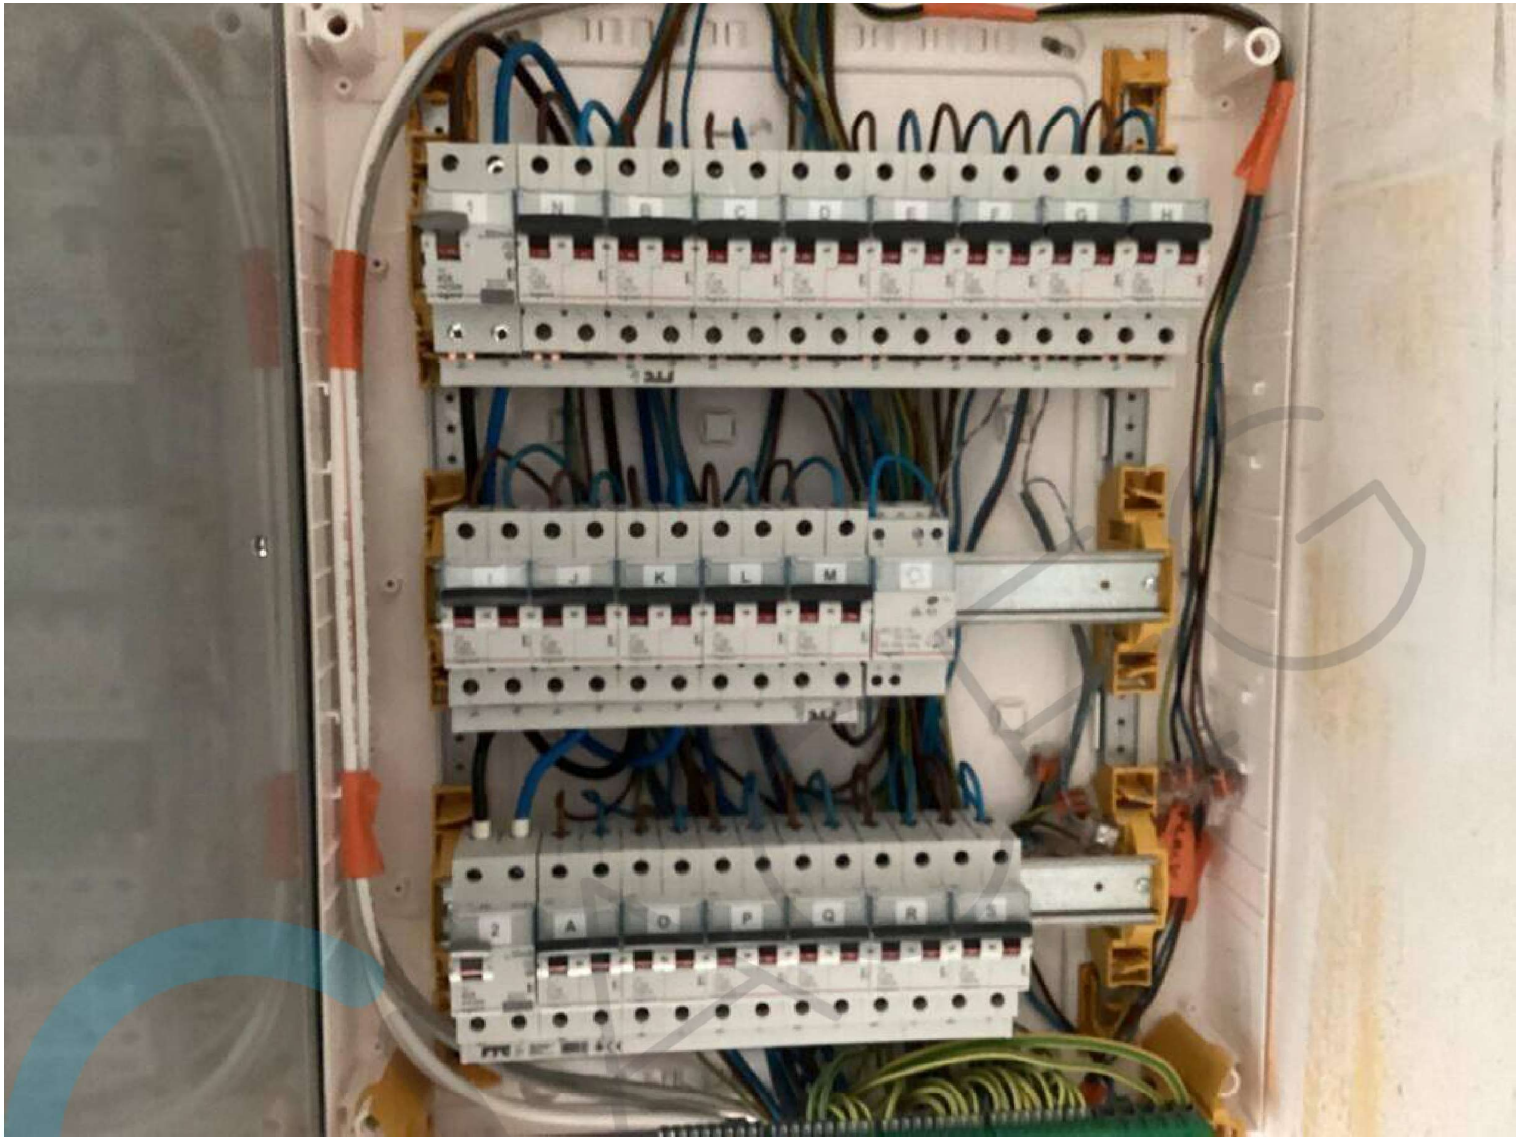

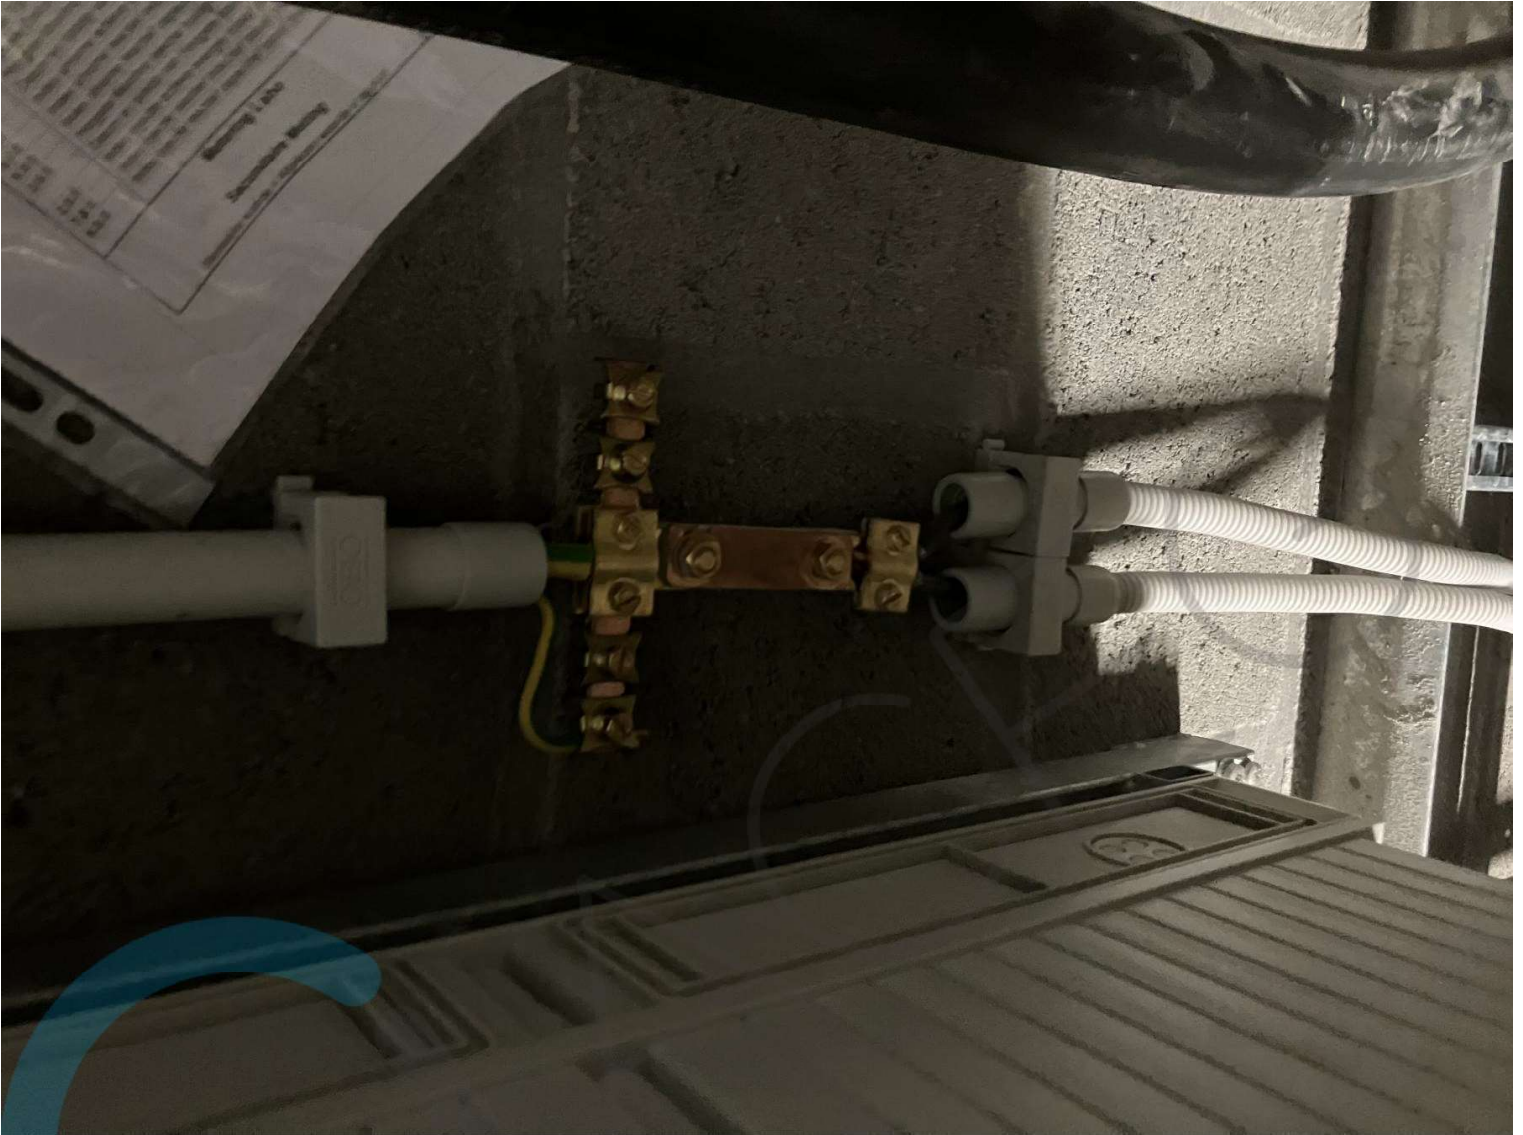


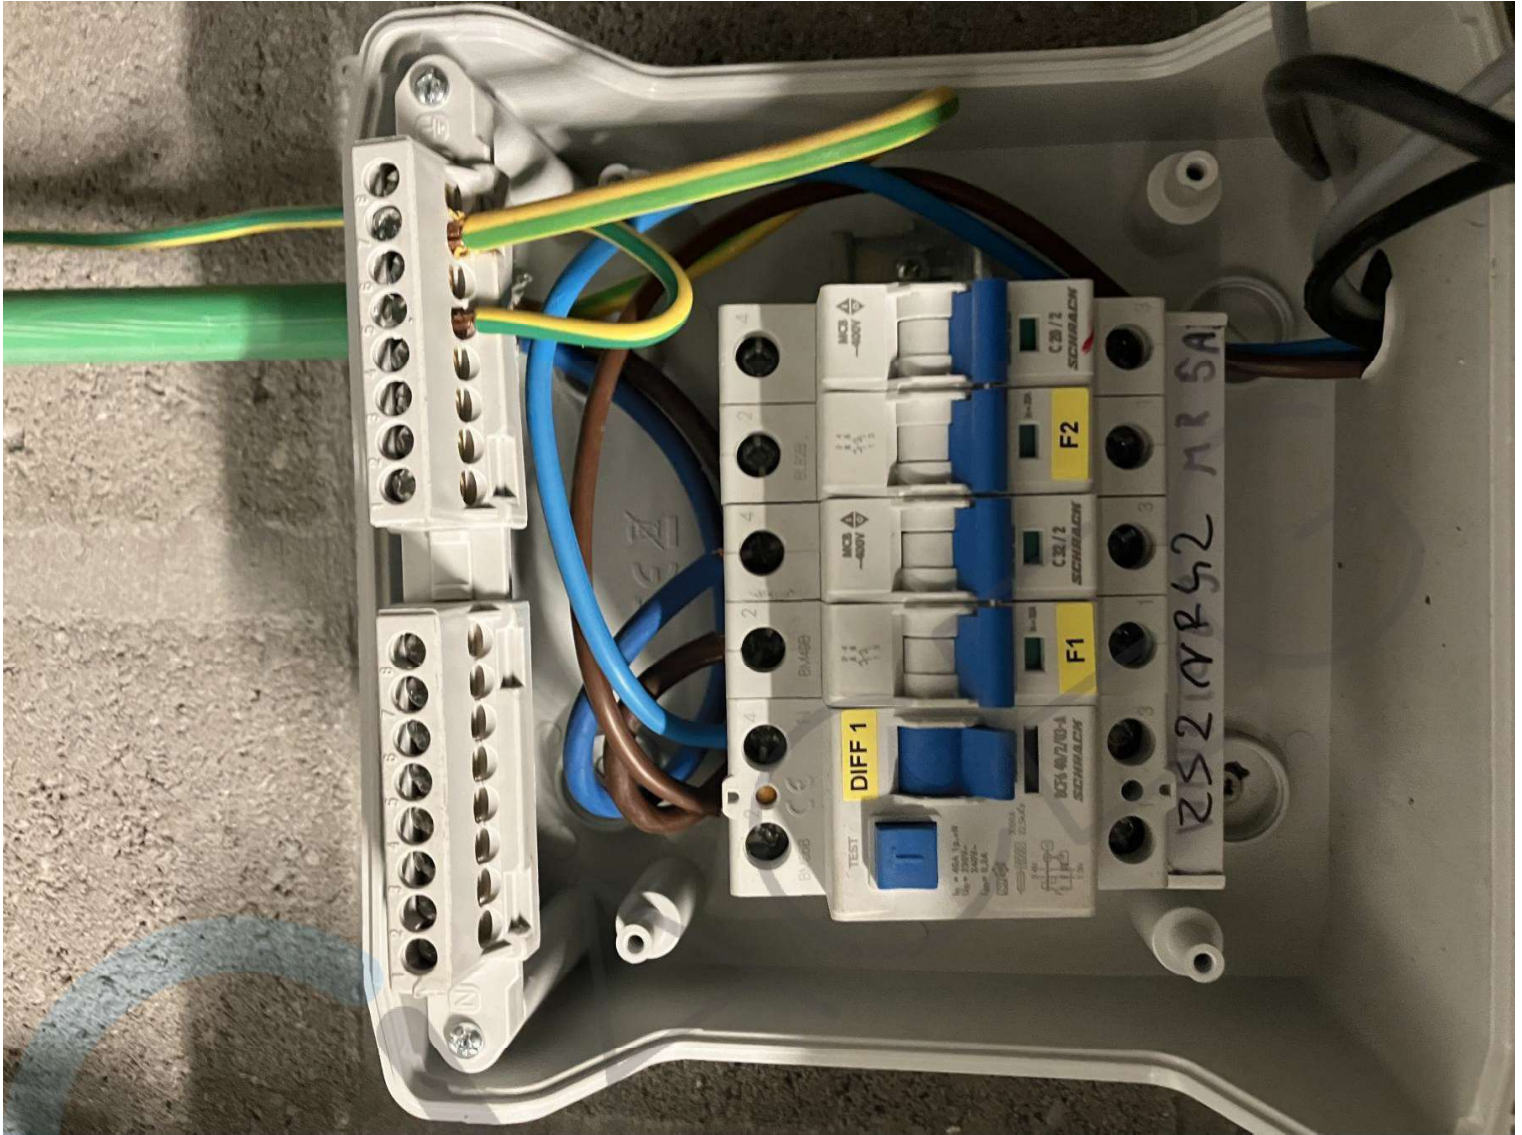







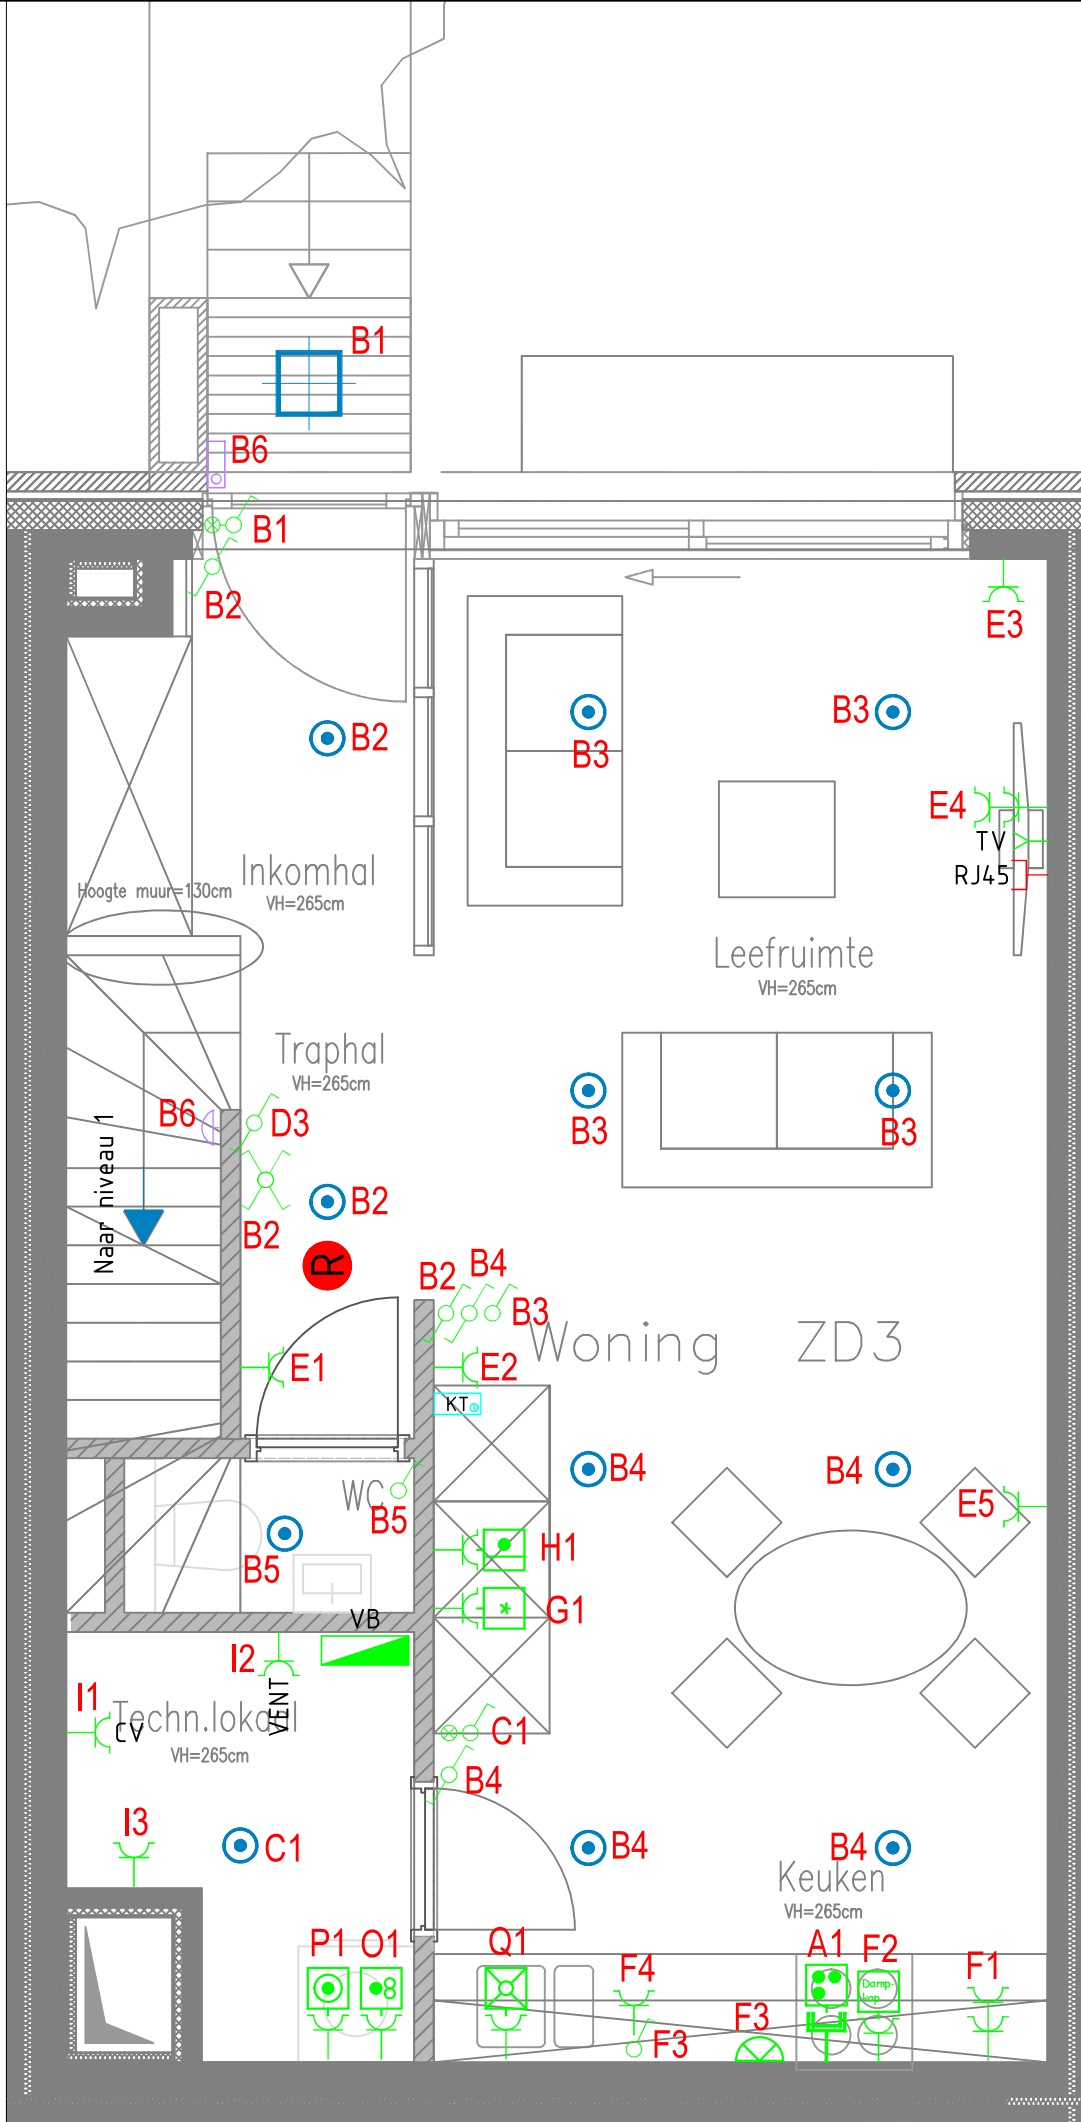

Bouwheer:
 Woning ZD3
 Du Roy De Blicquyiaan 5W
 1933 Sterrebeek

AB GROUP
 Roosterkensweg 21
 3520 Zonhoven




Projekt: Elektrische Installatie Projektnr.: 230301

Bouwheer: Woning ZD3

Datum: 28/09/2023

Titel: Grondplan

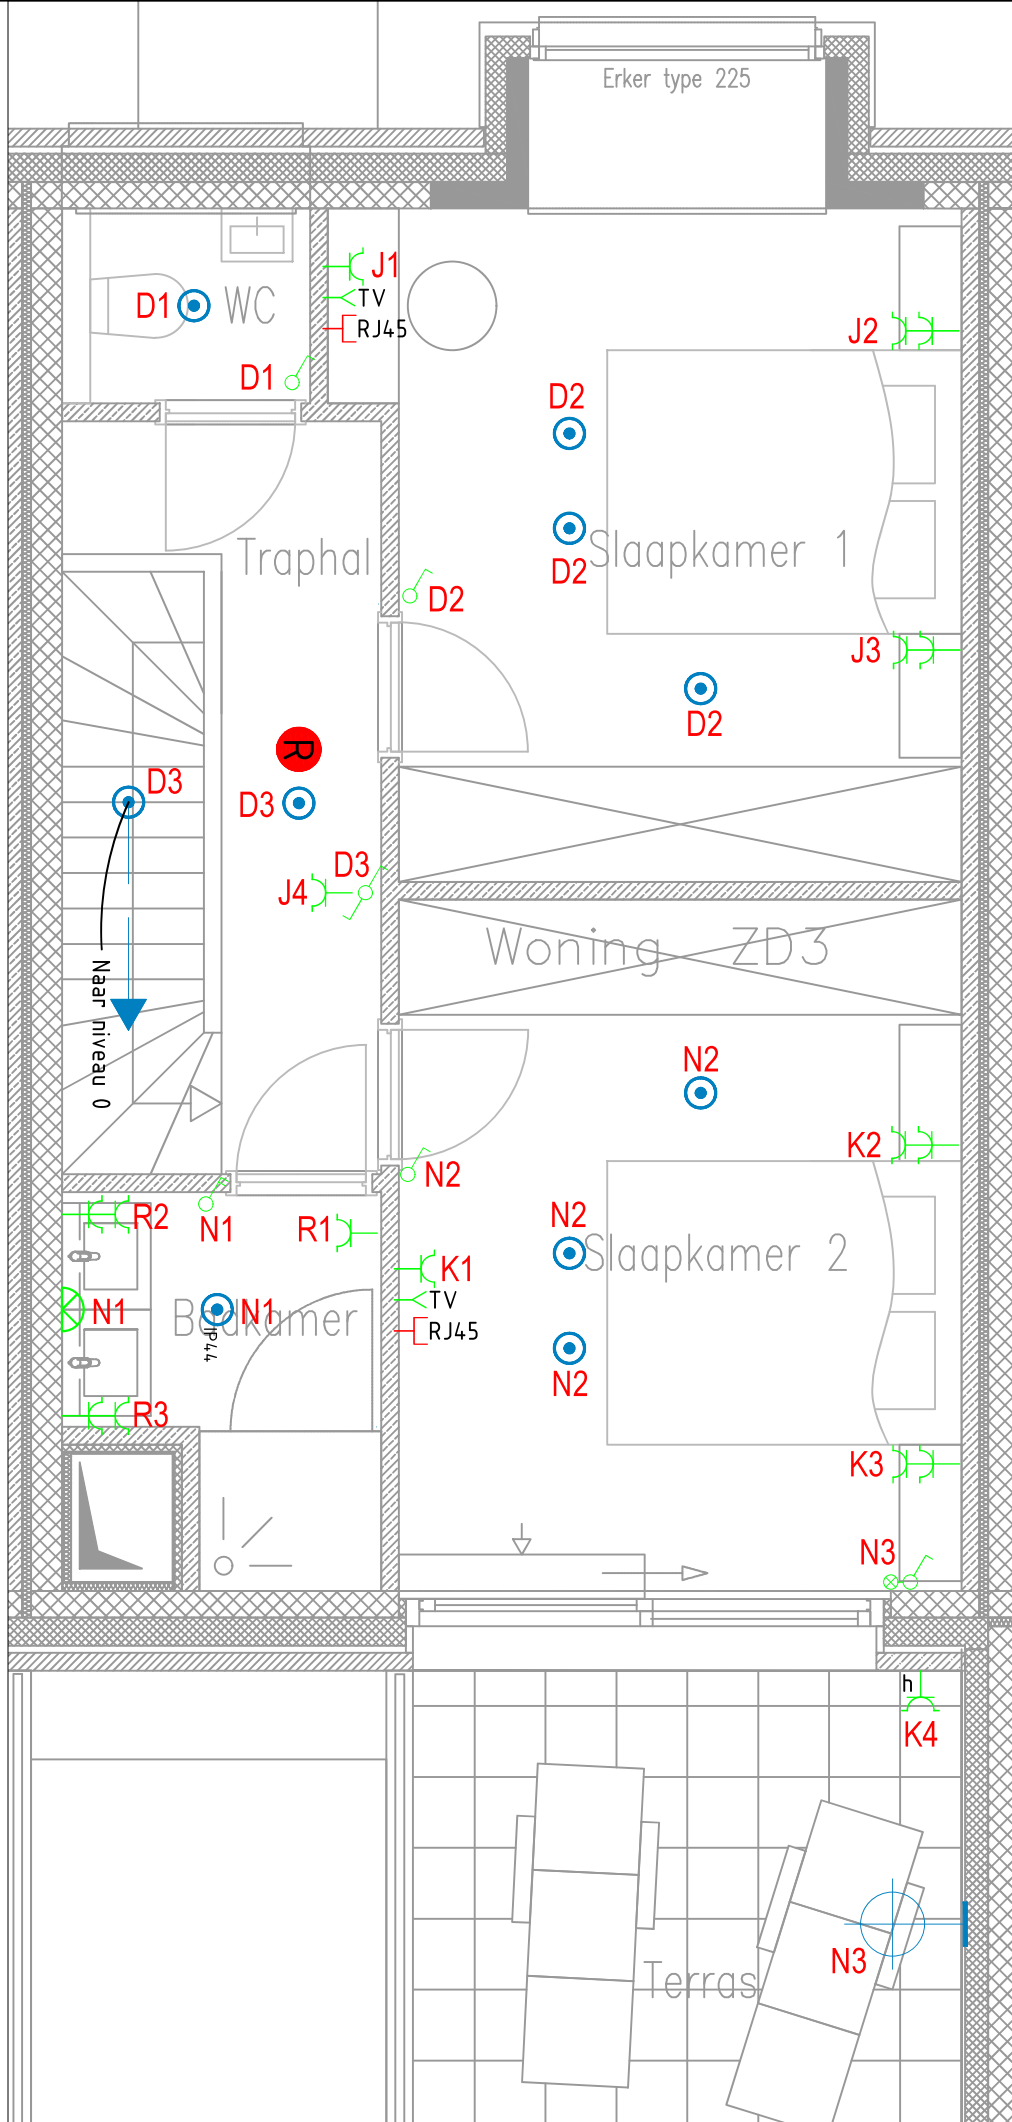


 GADVA
 Pletsjakk Houtbouw

Bouwheer:
 Woning ZD3
 Du Roy De Blicquy laan 5W
 1933 Sterrebeek

AB GROUP
 Roosterkensweg 21
 3520 Zonhoven





Projekt: Elektrische Installatie Projektnr.: 230301

Bouwheer: Woning ZD3

Datum: 26/09/2023

Titel: Duplex

Bordje in kelder

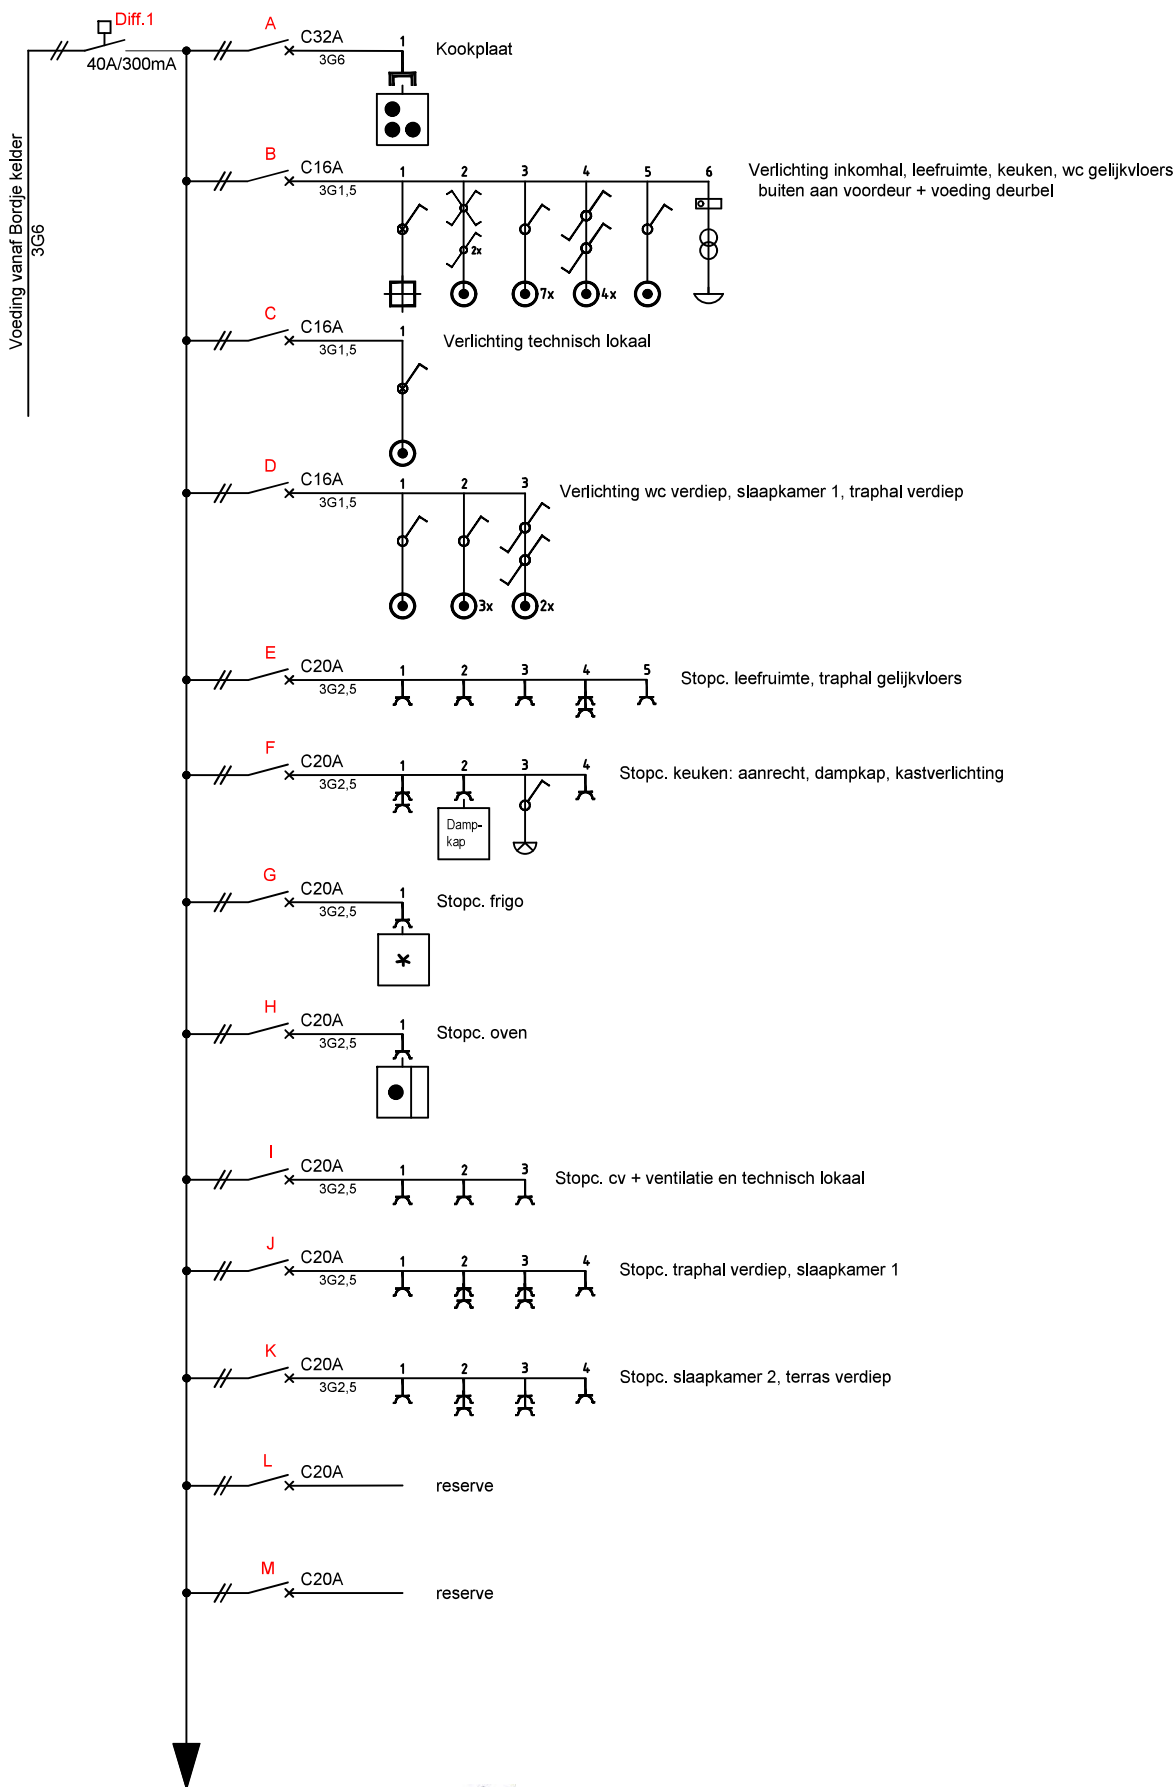

Pieter-Jan Hombrouckx
 P. Hombrouckx

